


Possibilidades Identificadas

Com base nas análises do checkpoint anterior alguns gargalos foram identificados, e propõe-se as seguintes ações:

O que produz	Para que serve
Gráfico de rede/dependência	Mostrar efeito dominó visualmente
Tabela + gráfico de priorização	Identificar qual gargalo atacar primeiro
Análise de causa raiz	Detalhar por que cada atraso aconteceu
Tabela + cronograma de ações	Sugestões concretas com prazos

Com a implementação dessas ações, projeta-se uma redução de aproximadamente 30% no lead time total do projeto. O destaque fica para a validação do dispositivo que elimina a causa raiz do efeito dominó, o que evita o envio de dispositivos errados e novos atrasos decorrentes desse problema.

Com isso, novas possibilidades de processos e otimizações foram identificadas, conforme ilustrado no gráfico a seguir.

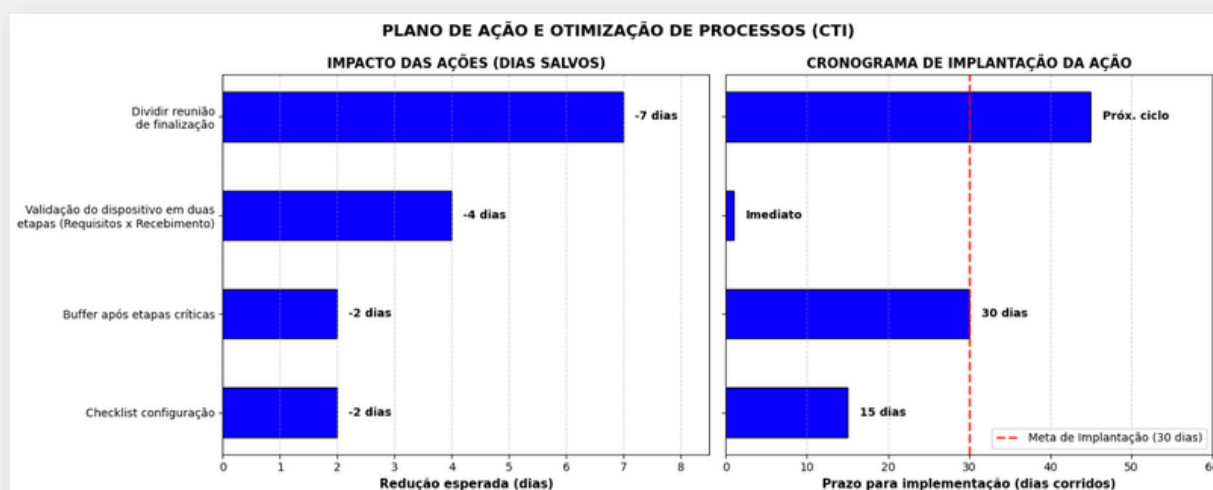

Análise dos Prazos de Implementação

Foi descrita a possibilidade de alterar e dividir a reunião de finalização, mas depende de aprovação, com isso o tempo de implantação está para próximo ciclo pois não é possível prever uma data em que isso entrará em vigor.

Validação do dispositivo em duas etapas (Requisitos e Recebimento) Garante conformidade entre o escopo e o hardware recebido, eliminando os 4 dias de atraso por incompatibilidade ou espera.

A estipulação de uma zona de segurança de 30 dias atende aos princípios da gestão por Cadeia Crítica. Ao eliminar as margens de proteção embutidas individualmente em cada atividade (geralmente reduzidas pela metade), o tempo total economizado é centralizado no final do cronograma como um buffer do projeto.

META: 30 DIAS DE PROTEÇÃO

Este buffer de 30 dias funciona como uma meta de proteção: qualquer atraso imprevisto nas etapas críticas é absorvido por esse período, garantindo que a entrega final do projeto não seja impactada. Caso nenhum imprevisto ocorra, o projeto pode ser entregue antes do prazo.

Por fim, o prazo de implantação para a alteração do escopo padrão do Checklist de Configuração foi definido em 15 dias. Esse período é necessário para mapear as variações de escopo e as regras de negócio específicas de cada cenário. Como não é possível aplicar um modelo único para todos os projetos, esse tempo garante a correta identificação dessas particularidades antes da execução.
